




sedapal


PABLO REYES C.
PRESIDENTE


Cesar
Vice Presidente
Curaçao
Honora
celebración
Dolo

Sector Lienegulla
FRANCIS DUMBER
PRESIDENTE
DIRECTOR
SEDAPAL





EDWIN
SUBDIRECTOR



Scanned with
CamScanner

AGENDA A TRATAR DE LOS PROYECTOS EN EL DISTRITO DE CIENEGUILLA

1. Convocatoria para la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico del Saldo de Obra del Proyecto "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Cieneguilla" – Obra Paralizada.
2. Aprobación del Estudio Definitivo y Expediente Técnico, y CONVOCATORIA – LICITACIÓN PÚBLICA para la ejecución de la obra del proyecto "Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Pueblos de la Margen Derecha e Izquierda del Primer Sector de Cieneguilla – Distrito de Cieneguilla".
3. Inicio de ejecución de la obra de la Reposición de Pavimento Flexible en la Avenida Nueva Toledo.

A handwritten signature in blue ink, circled with a blue oval.A handwritten signature in blue ink.A handwritten signature in blue ink.A handwritten signature in blue ink.A handwritten signature in blue ink.A handwritten signature in blue ink.

1. CONVOCATORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CIENEGUILLA" – OBRA PARALIZADA



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CIENEGUILLA

Nº	ACTIVIDAD	PLAZO EST. (D.C.)	INICIO	TÉRMINO	2020												2021											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
01 ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA																												
01.01	ELABORACIÓN DE REQUERIMIENTO Y ESTRUCTURA DE COSTOS	25	09/01/2020	02/02/20																								
01.02	CONTRATACIÓN DIRECTA - EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA (Art. 27 de la LCE)	90	03/02/2020	02/05/20																								
01.02.01	INFORME TÉCNICO - LEGAL PARA CONTRATACIÓN DIRECTA	15	03/02/2020	17/02/20																								
01.02.02	ESTUDIO DE INDAGACIÓN DE MERCADO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA	30	18/02/2020	18/03/20																								
01.02.03	APROBACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA (DIRECTORIO)	25	19/03/2020	12/04/20																								
01.02.04	PUBLICACIÓN SEACE Y FIRMA DE CONTRATO	20	13/04/2020	02/05/20																								
01.03	PRESENTACIÓN Y REVISIÓN DE PLAN DE TRABAJO	20	03/05/20	22/05/20																								
01.04	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA	180	23/05/20	18/11/20																								
01.05	SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA	60	19/11/20	17/01/21																								
02 EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA																												
02.01	CONTRATACIÓN PARA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA (Art. 167 del RLCE)	45	18/01/21	03/03/21																								
02.02	ACTOS PREVIOS AL INICIO DE EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA	30	04/03/21	02/04/21																								
02.03	EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA	270	03/04/21	28/12/21																								

Fuente: Gerencia de Proyectos y Obras (2020)



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSOLIDADO DE CONEX. ADICIONALES – OBRA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CIENEGUILLA

CONSOLIDADO TOTAL DE CONEXIONES DOMICILIARIAS ADICIONALES POR HABITACIÓN

Código	Conexión Agua Potable (Necesita Red)	Conexión Alcantarillado (Necesita Red)	Conexión Agua Potable y Alcantarillado (Necesita Red)	Conexión Agua Potable y Alcantarillado (Solo Conexión)
1	0	3	0	1
2	5	0	2	0
3	29	14	31	50
4	3	3	3	27
5	78	0	5	0
6	0	0	0	7
7	0	46	3	7
8	0	0	0	23
9	0	1	1	5
10	0	30	0	0
11	0	0	0	0
12	0	28	0	0
Total	115	125	45	120


Fuente: Informe N° 881-2018-EGSP/KLR

CONSOLIDADO TOTAL DE CONEXIONES DOMICILIARIAS ADICIONALES		
Descripción	Agua Potable	Alcantarillado
Conexiones Domiciliarias Adicionales - Necesitan	160	170
Conexiones Domiciliarias Adicionales - Solo	120	120
TOTAL	280	290



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

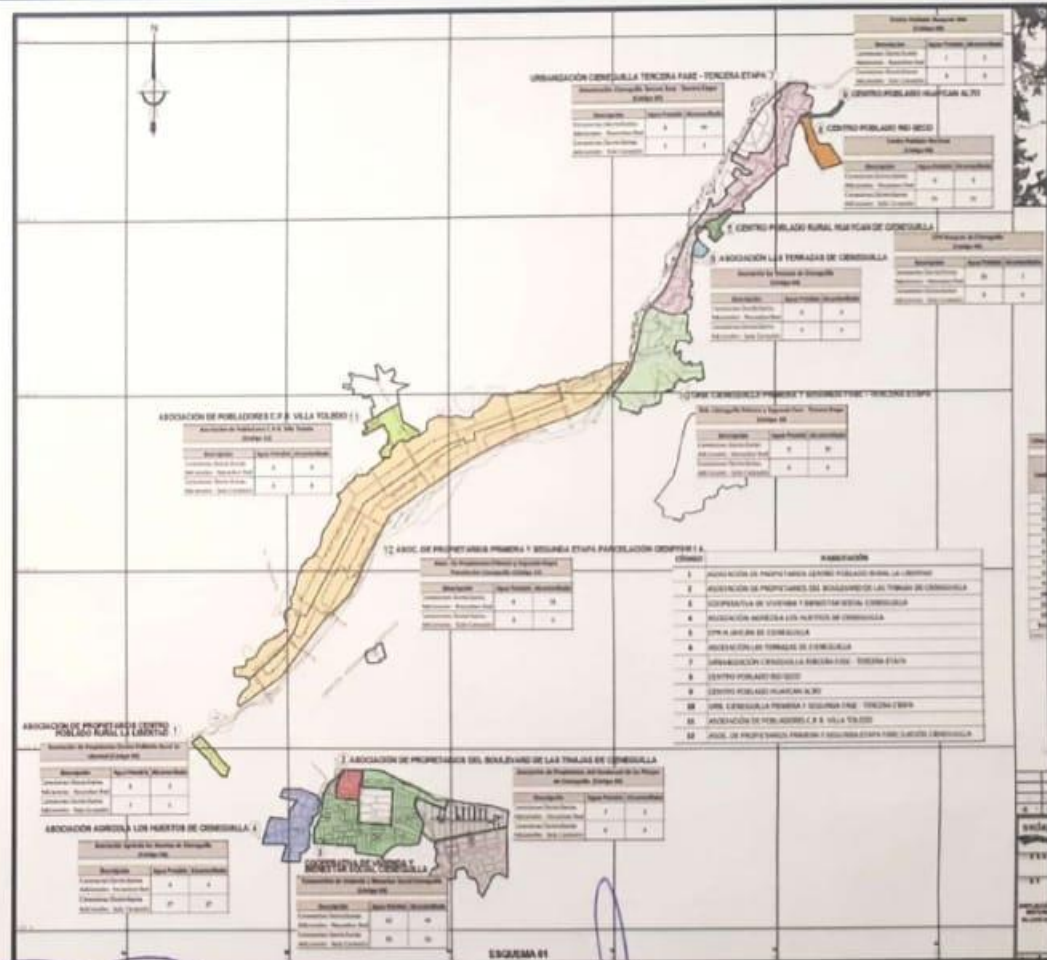

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

2. APROBACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO, Y CONVOCATORIA – LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL PRIMER SECTOR DE CIENEGUILLA – DISTRITO DE CIENEGUILLA"



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL PRIMER SECTOR DE CIENEGUILLA – DISTRITO DE CIENEGUILLA"

Nº	ACTIVIDAD	PLAZO EST. (DÍAS)	INICIO	TÉRMINO	2020												2021											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
01 CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO																												
01.01	RESOLUCIÓN DE CONTRATO	6	09/01/2020	14/01/2020																								
01.02	CULMINACIÓN ESTUDIO DEFINITIVO - EXPEDIENTE TÉCNICO	60	15/01/2020	14/03/2020																								
01.02.01	REVISIÓN Y CULMINACIÓN DE METRADOS																											
01.02.02	COMPATIBILIZAR PLANOS																											
01.02.03	REVISIÓN Y CULMINACIÓN DE PRESUPUESTO DE OBRA																											
01.02.04	ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS																											
01.02.05	COMPATIBILIZACIÓN DE MEMORIA, PLANOS, PRESUPUESTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS																											
01.02.06	CONFORMACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO																											
01.02.07	ELABORACIÓN DEL INFORME DE CONSISTENCIA Y APROBACIÓN																											
02 EJECUCIÓN DE LA OBRA																												
02.01	PROCESO DE CONVOCATORIA	60	15/03/20	23/05/20																								
02.01.01	CONVOCATORIA	1	15/03/20	15/03/20																								
02.01.02	CONSULTAS Y OBSERVACIONES	19	16/03/20	03/04/20																								
02.01.03	PLAZO PARA ELEVAR OBSERVACIONES Y PRONUNCIAMIENTO	12	04/04/20	15/04/20																								
02.01.04	PRESENTACIÓN DE OFERTAS	1	16/04/20	16/04/20																								
02.01.05	CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS	12	17/04/20	28/04/20																								
02.01.06	BUENA PRO	1	29/04/20	29/04/20																								
02.01.07	CONSENTIMIENTO Y PUBLICACIÓN DE BUENA PRO	11	30/04/20	10/05/20																								
02.01.08	PRIMA DE CONTRATO	12	11/05/20	22/05/20																								
02.02	ACTOS PREVIOS AL INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA (Art. 176 del RLCE: Adelanto directo, entrega terreno, etc.)	30	23/05/20	21/06/20																								
02.03	EJECUCIÓN DE OBRA	390	22/06/20	18/07/21																								
02.04	RECEPCIÓN DE OBRA	120	17/07/21	13/11/21																								



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Fuente: Gerencia de Proyectos y Obras (2020)

[Handwritten signatures and notes]

3. INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA AVENIDA NUEVA TOLEDO



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EJECUCIÓN DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN AV. NUEVA TOLEDO

Nº	ACTIVIDAD	PLAZO EST. (D.C.)	INICIO	TÉRMINO	2020			
					ENE	FEB	MAR	ABR
01 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 101-2019-SEDAPAL								
01.01	PERFECCIONAMIENTO Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE OBRA	15	13/01/2020	27/01/20				
01.02	REQUISITOS PARA EL INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA (Art. 176 RLCE)	15	28/01/20	11/02/20				
01.03	EJECUCIÓN DE OBRA	45	12/02/20	27/03/20				

Fuente: Gerencia de Proyectos y Obras (2020)



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
